



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Attuazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n°69/2013
A.d.P. 31 marzo 2008 "Moranzani"
Stato di avanzamento dei lavori e attività – 23 ottobre 2013**

INDICE

Accordo di programma "Moranzani" del 31.03.2008	5
Art.3 – Vasche di stoccaggio provvisorio su area 23 ha.....	5
Art.4 A - Impianti di trattamento preliminare.....	7
Art.4 C - Cassa di colmata in ampliamento del Molo Sali.....	7
Art.4 D - Discarica "Moranzani".....	8
Art.6 – Interventi su linee elettriche.....	9
Art.7 – Interventi sulla viabilità.....	10
Art.8 - Interventi sulla rete idraulica del bacino del Lusore.....	11
Art.9 - Parchi urbani.....	13
Art.11 – Trasferimento San Marco Petroli.....	14
Art.12 – Interventi di fognatura.....	14
Accordo Integrativo del 04.02.2011 dell'A.d.P. "Moranzani"	16
Art.3 - Adeguamento funzionale di Via dell'Elettronica.....	16
Art.4 - Collegamento stradale tra Via dell'Elettricità e SR11.....	16
Art.5 - Terminal delle Autostrade del Mare.....	17

Accordo di programma "Moranzani" del 31.03.2008 (Rif.articoli A.d.P. "Moranzani")

Art.3 – Vasche di stoccaggio provvisorio su area 23 ha

Realizzazione Terza Vasca

Soggetto realizzatore	Magistrato alle Acque di Venezia
Aggiornamento Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> I lavori risultano ultimati ed è in fase di redazione il collaudo tecnico funzionale.
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> Con la redazione del collaudo funzionale, nel mese di novembre si potrà procedere con consegna della vasca per la successiva gestione.

Rinnovo AIA Vasche Deposito Preliminare in area 23 ha – Vasca Sud

Soggetto gestore	SIFA S.c.p.a.
Aggiornamento Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> È stata rinnovata l'AIA con Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente n. 48 del 31.07.2013. Scadenza 31.12.2014 .
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> Prosecuzione con le attività programmate.

Quantitativi conferiti al 30.09.2013

VASCHE DI STOCCAGGIO PROVVISORIO E PRECARICO SITE IN AREA 23 HA					
Vasca C per rifiuti pericolosi					
Quantitativi conferiti al 30/09/2013			Quantitativi autorizzati		Delta
18.873,43	m ³	4.611,72 m ³ di pericolosi per organici	40.000,00	m ³	21.126,57
		14.261,71 m ³ di pericolosi per inorganici			
Vasche A1, A2 e B per rifiuti non pericolosi					
Quantitativi conferiti al 30/09/2013			Quantitativi autorizzati		Delta
	58.354,71	m ³	67.000,00	m ³	8.645,29
Vasche D ed E per rifiuti non pericolosi					
Quantitativi conferiti al 30/09/2013			Quantitativi autorizzati		Delta
	106.706,15	m ³	134.000,00	m ³	27.293,85


L'andamento negli anni è riportato nella tabella sottostante:

	2010	2011	2012	2013 (sett.)	Totale
Vasca Nord - Pericolosi (Sezione C)	2.767,68	11.813,64	2.923,53	1.368,56	18.873,41
Vasca Nord - Non Pericolosi (Sezioni A1, A2 e B)	53.979,73	-	-	4.374,98	58.354,71
Vasca Sud - Non Pericolosi (Sezioni D ed E)	24.300,64	65.763,30	11.429,31	5.212,91	106.706,16

I materiali conferiti sono principalmente :

- terre e rocce da scavo circa 88%;
- fanghi di dragaggio circa 2%
- fanghi prodotti da trattamento acque di falda circa 5%;
- rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica circa 5%.

Rappresentazione grafica mensile dei conferimenti alle vasche di stoccaggio provvisorio nell'area 23ha

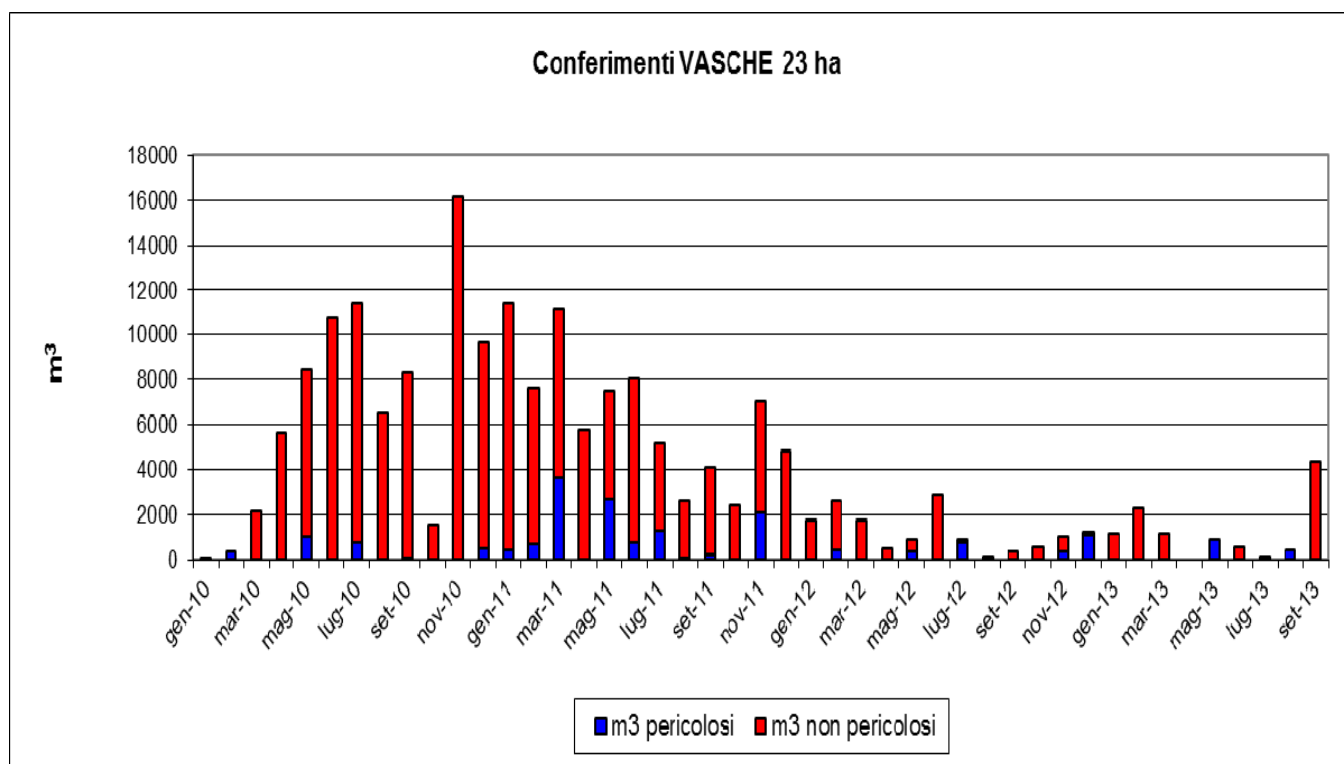

Art.4 A - Impianti di trattamento preliminare

Vasche accettazione/caratterizzazione e trattamenti fisici

Soggetto realizzatore	SIFA S.c.p.a.		
Aggiornamento Stato di avanzamento lavori	di	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIFA ha comunicato l'avvio, a far data dal 16.01.2013, dei lavori aventi carattere propedeutico di sistemazione dell'area. ▪ In attesa di trasmissione da parte del Concessionario regionale del progetto esecutivo validato 	
Criticità		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tali impianti sono strettamente connessi con l'avvio della gestione Discarica Moranzani e quindi la loro realizzazione dovrà essere coerente con il conferimento dei volumi previsti alla Discarica. 	
Programmazione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosecuzione con le attività istruttorie e autorizzatorie. 	

Impianto di trattamento chimico di rifiuti contaminati da inorganici (Hegemann)

Soggetto realizzatore	SIFA S.c.p.a.		
Aggiornamento Stato di avanzamento lavori	di	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIFA ha comunicato l'avvio, a far data dal 16.01.2013, dei lavori aventi carattere propedeutico di sistemazione dell'area. 	
Criticità		<ul style="list-style-type: none"> ▪ E' necessario che il Concessionario Regionale inoltri alla Commissione VIA Regionale la richiesta di modifica relativamente ad alcune prescrizioni che aumentano significativamente i costi del progetto, non previsti dal quadro economico dell'AdP 31.03.2008. ▪ Tale impianto è strettamente connesso con l'avvio della gestione Discarica Moranzani e quindi la loro realizzazione dovrà essere coerente con il conferimento dei volumi previsti alla Discarica. 	
Programmazione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	

Impianti trattamento HPSS, Novosol e Limocon

Soggetto realizzatore	SIFA S.c.p.a.		
Programmazione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	

Art.4 C - Cassa di colmata in ampliamento del Molo Sali

Soggetto competente | **SIFA S.c.p.a.**

Criticità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel corso delle attività di refluentamento si sono verificati degli assestamenti del palancolato perimetrale che hanno comportato una modifica alle modalità di gestione ed una conseguente riduzione della volumetria conferibile. ▪ Il concessionario regionale deve predisporre un progetto per la risoluzione della criticità che porta la potenzialità da 750.000mc, inizialmente prevista, a 500.000mc.
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosecuzione con le attività già programmate.

Quantitativi conferiti al MOLO SALI 30.09.2013

MOLO SALI			
Quantitativi conferiti al MOLO SALI fino al 30/09/2013	Capacità	Delta	
m ³ calcolati in sezione (-18%)	234.619,06	750.000,00	515.380,94

Art.4 D - Discarica "Moranzani"

Soggetto realizzatore

SIFA S.c.p.a.

Aggiornamento Stato di avanzamento lavori

di

- SIFA ha comunicato l'avvio lavori a far data dal 16.01.2013
- Con nota del 2.09.2013 è stato richiesto a SIFA di avviare entro il 15.09.2013 i lavori inerenti l'approntamento del lotto 1/fase 1 e del lotto 2/fase 1, tenendo conto delle indicazioni di Terna relative alla esistenza di una linea elettrica sulle aree interessate dalla realizzazione di tali lotti.
- Il 23.10.2013 SIFA ha comunicato, via mail, lo stato di avanzamento delle attività, come di seguito riportate:
 - rimozione vegetazione perimetrale, partendo da lato Nord della S.P. n.23 Via Moranzani in quanto interferente con le lavorazioni e tracciatura dei diaframmi;
 - bonifica bellica nelle aree di lavoro relative alle opere perimetrali di diaframmatatura;
 - inizio opere di regolazione superfici con livellamento zone depresse con riporto di materiale;
 - avvio campo prove per determinazione miscela per diaframma plastico perimetrale per la realizzazione dei diaframmi per la messa in sicurezza delle aree su cui dovrà essere realizzata la discarica "Vallone Moranzani". La macchina operatrice cingolata tipo "Casagrande" sarà presente in cantiere dal 4 novembre p.v. , la durata del campo prove è prevista in circa un mese.
- Il Progetto Esecutivo è in fase di validazione da soggetto qualificato terzo e sarà trasmesso alla Regione del Veneto al massimo entro una decina di giorni.
Dopo la presentazione del Progetto Esecutivo validato ed approvato, nel rispetto di quanto richiesto dalla Regione del Veneto, recependo le prescrizioni di sicurezza e di operatività richieste da TERNA, inizieranno i lavori per la realizzazione della discarica "Vallone

Criticità	<p>Moranzani" per i Lotti 1/Fas1 e Lotti 2 /Fase 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ E' urgente la realizzazione della discarica, anche per il risezionamento del fosso "Fondi a Est".
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizzazione del lotto 1 prima fase e lotto 2 prima fase pur nelle more della rimozione degli elettrodotti TERNA

D.1 - Messa in sicurezza permanente area "Moranzani B"

Soggetto realizzatore	SIFA S.c.p.a.
Aggiornamento Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIFA ha comunicato l'avvio dei lavori a far data dal 01.04.2013.
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosecuzione con le attività già programmate.

Art.6 – Interventi su linee elettriche

Artt.6.1 / 6.2 – Linee ed impianti TERNA

Soggetti competenti	TERNA S.p.A. e SIFA S.c.p.a.
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In esito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3205 del 10.06.2013, relativa all'udienza del 30.04.2013, con la quale è stato annullato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, TERNA ha comunicato in data 12.06.2013 la sospensione delle attività su territorio . ▪ In data 05.11.2013 il Consiglio di Stato si esprimerà sul ricorso per ottemperanza presentato da TERNA circa la possibilità di procedere con le attività sulle aree non interessate dal parere MIBAC annullato.
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosecuzione con l'attività inerente la realizzazione della nuova condotta SNAM per la risoluzione di interferenze con gli interventi dell'AdP Moranzani, con convocazione, entro novembre 2013, della Conferenza di Servizi da parte del Comune di Venezia, come definito nell'incontro del 22.10.2013.

Art.6.3 - Interventi per le linee elettriche B.T. e M.T – ENEL

Soggetti competenti	ENEL S.p.A. e SIFA S.c.p.a.
Aggiornamento Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ENEL ha presentato a maggio 2013 al Comune di Venezia la comunicazione di inizio lavori/permesso di costruire relativo ai lavori della Cabina Primaria "Fusina 2". ▪ Procedono le attività connesse alla gestione delle terre e rocce da scavo nonché di bonifica di competenza del Concessionario Regionale.

Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosecuzione con le attività programmate.
-----------------------	---

Art.7 – Interventi sulla viabilità

Nodo Malcontenta

Soggetto competente	Autorità Portuale di Venezia
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19.03.2013 Conferenza di servizi decisoria indetta da APV per l'approvazione del progetto definitivo. ▪ 15.04.2013 consegna dei lavori all'impresa appaltatrice. ▪ 26.04.2013 il TAR veneto ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento di aggiudicazione. ▪ 10.10.2013 il TAR veneto prevedeva di discutere il ricorso ▪ 09.10.2013 il ricorso al TAR è stato ritirato
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ripresa del procedimento da parte della stazione appaltante con l'impresa appaltatrice per il riavvio dei lavori

Prolungamento via dell'Elettricità (raddoppio SR 11)

Soggetto competente	Provincia di Venezia
Aggiornamento Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Con nota del 02.09.2013 la regione ha inviato ai sottoscrittori bozza di accordo di programma con una richiesta di integrazioni sui progetti preliminari di competenza Provinciale e di APV. ▪ La Provincia di Venezia ha completato il progetto preliminare della fase transitoria prevista dal pre-accordo di programma integrativo del 21.12.2012. ▪ Sono stati redatti i documenti per la procedura di screening VAS. Tali documenti comprendono il progetto della rotatoria tra la SP24 e la SR11 ed il relativo percorso ciclopedonale ed anche il progetto dello svincolo a livelli sfalsati sulla SS309. ▪ In data 23.10.2013 la commissione VIA provinciale si è espressa sui progetti di variante circa la non assoggettabilità alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale .
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ È in programma per il 05.11.2013 una riunione tecnica tra i sottoscrittori per la condivisione preliminare del testo dell'AdP integrativo e degli elaborati progettuali.

Svincoli a livelli sfalsati sulla SS 309 Romea

Soggetto competente del Progetto Preliminare	Autorità Portuale di Venezia
Soggetto competente	Provincia di Venezia
Aggiornamento Stato di	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A fine luglio è stato inviato il progetto all'ANAS per ottenere il parere

avanzamento lavori	<p>di massima.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Con nota del 02.09.2013 la regione ha inviato ai sottoscrittori bozza di accordo di programma con una richiesta di integrazioni sui progetti preliminari di competenza Provinciale e di APV. ▪ L’Autorità Portuale di Venezia ha completato il progetto preliminare dello svincolo sulla Romea previsto dal pre-accordo di programma integrativo del 21.12.2012. ▪ Sono stati redatti i documenti per la procedura di screening VAS. Tali documenti comprendono il progetto della rotatoria tra la SP24 e la SR11 ed il relativo percorso ciclopedonale ed anche il progetto dello svincolo a livelli sfalsati sulla SS309. ▪ In data 23.10.2013 la commissione VIA provinciale si è espressa sui progetti di variante circa la non assoggettabilità.
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ È in programma per il 05.11.2013 una riunione tecnica tra i sottoscrittori per la condivisione preliminare del testo dell’AdP integrativo e degli elaborati progettuali.

Art.8 - Interventi sulla rete idraulica del bacino del Lusore

Interventi a cura del Commissario Emergenza Idraulica ex OPCM 3621/2007, ora Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Soggetto competente	Consorzio di Bonifica Acque Risorgive	
<i>Intervento A.1.1-1° lotto .- Riduzione ostruzioni Fossa di Chirignago a nord dell’autostrada A4.:</i>		
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavori collaudati 	
<i>Intervento A.1.1 - 2° lotto - Ricalibratura fossa di Chirignago a sud dell’autostrada A4:</i>		
Aggiornamento Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Con delibera n.507 del 31.07.2013 Il Consorzio di Bonifica ha approvato il progetto esecutivo ed è stata avviata la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori (conclusione gara 31.12.2013) ▪ Il 14.10.2013 con nota prot. 15292 il Consorzio di bonifica ha avviato il procedimento che precede la determinazione della indennità provvisoria di esproprio (art. 17 DPR 327/2001) 	
<i>Intervento A.2 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – 1° lotto – Nuovo sifone sotto il Canale di Oriago:</i>		
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavori collaudati 	
<i>Intervento A.2- Interventi rete idraulica bacino Lusore – 2° lotto – Ricalibratura corso d’acqua Fondi a Sud:</i>		
Aggiornamento Stato di avanzamento lavori	di	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il 23.07.2013 con nota prot. 11244 il Consorzio di bonifica ha avviato il procedimento che precede la determinazione della indennità

provvisoria di esproprio (art. 17 DPR 327/2001)

Intervento B.4 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore – Potenziamento dell'idrovora di Ca' Emiliani:*

Stato di avanzamento lavori | ■ Lavori collaudati

Interventi a carico del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Soggetti competenti

Per la progettazione: SIFA S.c.p.a.

Per la realizzazione: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Intervento A.1.2 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore – Ricalibratura Fosso 2, Fosso 6, Fosso 7, Diversivo Fosso 7 e Fosso Colombara.*

Intervento A.3 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore – 2° lotto – Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino Cesenego-Vecchio Comuna (Parco Lusore) e collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo tramite il circuito del Forte Tron.*

Intervento A.4 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, ricalibratura Fondi a Est, fosso di via Moranzani e nuovo collegamento con Fondi a Sud.*

Intervento A.5 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore – Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino di Malcontenta.*

Intervento A.6 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore – Sistemazione a parco del Parco Lusore e del Parco Malcontenta.*

Intervento B.1 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore – Nuova inalveazione del Lusore – Menegon.*

Intervento B.2 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore – Adeguamento Idrovora Malcontenta con deviazione canale di scarico e manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche*

Stato di avanzamento lavori

- Il progetto definitivo complessivo suddiviso in stralci è stato approvato ad agosto 2012, con una previsione economica complessiva maggiore rispetto a quanto inserito nell'AdP Moranzani.
- È in corso di redazione una convenzione tra Regione Veneto e Consorzio di Bonifica per regolamentare: attività espropriative, attività di validazione dei progetti/approvazione, modalità di erogazione dei fondi derivanti dai proventi della tariffa, necessari per la realizzazione delle opere.
- A seguito delle richieste della Commissione Regionale Via sono stati effettuati ulteriori carotaggi sui terreni per analizzare anche l'eluato per definire la collocazione finale in relazione alle prescrizioni impartite.
- Con questi nuovi dati è stata eseguita una integrazione al progetto ed in questi giorni sarà consegnato il progetto esecutivo del primo stralcio relativo ai "Fondi a Sud e a Est"

Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosecuzione con le attività programmate inerenti la realizzazione delle opere di primo stralcio.
-----------------------	---

Interventi a carico del Comune di Venezia

Soggetti competenti	<p>Per la progettazione: Concessionario Regionale Per la realizzazione: Comune di Venezia</p>
----------------------------	--

Intervento B.3 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Realizzazione di una vasca di prima pioggia nell'ex alveo del Lusore

Intervento B.5 - Realizzazione di nuova fognatura in Via Colombara

Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli interventi di competenza del Comune di Venezia sono previsti a partire dal 2015, e comunque dopo la realizzazione di alcuni interventi propedeutici quali la nuova stazione elettrica malcontenta di TERNA e la successiva deviazione del Lusore.
-----------------------	---

Art.9 - Parchi urbani

Parco urbano nell'area Malcontenta C

Soggetto competente	Comune di Venezia
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedere con l'acquisizione dell'area da parte del Comune di Venezia.

Bosco di Marghera – Parco del Brombeo

Soggetto competente	Provincia di Venezia
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Progetto preliminare del Bosco di Marghera approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 460 del 12 dicembre 2006. ▪ Approvazione nuovo progetto preliminare del Bosco di Marghera con deliberazione della Giunta provinciale n. 119 del 7 agosto 2012 ▪ L'approvazione del progetto definitivo del Bosco di Marghera, da parte della Giunta Provinciale di Venezia è programmato per il mese di novembre 2013.
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedere con le attività tecnico/amministrative finalizzate alla realizzazione dell'intervento.

Parco lineare Moranzani

Soggetto competente	SIFA S.c.p.a.
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ programmazione e realizzazione dell'intervento di bonifica in "area tralicci".

Art.11 – Trasferimento San Marco Petroli

Soggetto competente	Regione del Veneto per tramite di SIFA S.c.p.a.
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ procedere con le verifiche economiche.

Art.12 – Interventi di fognatura

Soggetto competente	Comune di Venezia
<i>p.to 1 Completamento della rete di fognatura separata nell'area di Malcontenta</i>	
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non ancora pervenuta progettazione da parte del Comune di Venezia
<i>p.to 2 Completamento rete fognaria e relativi allacciamenti area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta (ora potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini Fusina e Campalto)</i>	
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavori ultimati relativi allo stralcio finanziato ▪ Decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 21 del 10.04.2013 proroga il termine per la presentazione degli atti di contabilità finale al 30.06.2015
<i>p.to 3 Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3.</i>	
Criticità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non ancora definiti i contenuti dell'Accordo di Programma denominato "1^ zona industriale" per la gestione delle acque di dilavamento in un'area di Porto Marghera.
<i>p.to 4 Opere di disinquinamento ambito Fusina: diminuzione acque parassite</i>	
Soggetto attuatore	Veritas
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24.09.2012 proroga ultimazione delle attività al 31.12.2014. ▪ Lavori in corso, erogati ulteriori contributi Legge speciale per Venezia
<i>p.to 5 Progetto relativo ad attività di eliminazione delle acque parassite nel bacino di Fusina</i>	
Soggetto attuatore	Veritas
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intervento collaudato

p.to 6 *Ristrutturazione della rete fognaria della zona del centro di Marghera (VE)*

Stato di avanzamento lavori | ▪ Intervento collaudato

p.to 7 *Ristrutturazione rete fognaria secondaria zona Nord e Centro Marghera (ora potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma: bacini di Fusina e Campalto)*

Stato di avanzamento lavori | ▪ Lavori ultimati relativi allo stralcio finanziato
▪ Decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 21 del 10.04.2013 proroga il termine per la presentazione degli atti di contabilità finale al 30.06.2015

p.to 8 *Fognature afferenti all'impianto di Fusina*

Criticità | ▪ Non ancora pervenuta progettazione da parte del Comune di Venezia

Accordo Integrativo del 04.02.2011 dell'A.d.P. "Moranzani"

Art.3 - Adeguamento funzionale di Via dell'Elettronica

Soggetto competente	Autorità Portuale di Venezia
<i>Primo stralcio: potenziamento del collegamento stradale e ferroviario</i>	
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16.04.2013 approvazione di una perizia di variante; ▪ i lavori sono stati ultimati nell'estate 2013 anche a seguito di notevoli imprevisti di natura ambientale e geotecnica.
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prosecuzione con l'iter tecnico/amministrativo inerente la chiusura dei lavori.
<i>Secondo stralcio: Prima Fase - Realizzazione di tre rotonde</i>	
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In fase di redazione progetto esecutivo ed acquisizione di pareri da parte degli enti competenti
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosecuzione con le attività programmate.
<i>Secondo stralcio: Seconda Fase – Ampliamento del sedime stradale</i>	
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In fase di redazione progetto esecutivo
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosecuzione con le attività programmate.

Art.4 - Collegamento stradale tra Via dell'Elettricità e SR11

Soggetto competente	Autorità Portuale di Venezia
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Progettazione definitiva ultimata ▪ E' in corso l'attività espropriativa
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosecuzione con le attività programmate.

Art.5 - Terminal delle Autostrade del Mare

Bonifica aree

Soggetto competente	Autorità Portuale di Venezia
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'attività di bonifica è il corso. ▪ Si sono riscontrate notevoli contaminazioni da amianto non previste in sede progettuale; sono stati fatti degli adeguamenti al progetto, trattandosi di varianti non sostanziali e correzioni delle procedure di sicurezza concordate con lo Spisal; ▪ Nel mese di ottobre 2013 Autorità Portuale ha richiesto alla Regione Veneto la possibilità di conferire presso gli impianti Moranzani il materiale contenente amianto (circa 24.000mc) riscontrato nel sito. In data 26.09.2013 è stato convocato il Comitato Utenti, per sottoporre la richiesta, il cui esito è stato comunicato all'Autorità Portuale con nota del 03.10.2013.
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosecuzione con le attività programmate.

Piattaforma logistica Fusina

Soggetto competente	Autorità Portuale di Venezia
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfezionamento della Variante Urbanistica a seguito di accordo di programma ex art. 32 LR35/2001: attività in corso da parte della Regione Veneto ▪ In data 27.09.2013 la Regione Veneto ha chiesto l'invio del Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica VAS: ▪ L'attività di demolizione delle strutture preesistenti ha raggiunto il 90% ▪ L'attività di realizzazione della darsena nord ha raggiunto il 50%;L'attività di bonifica è il corso. ▪ Sono in corso di realizzazione alcuni edifici.
Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosecuzione con le attività programmate.
