



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Relazione di sintesi ad uso dei sottoscrittori A.d.P. 31 marzo 2008
“Moranzani” per l’attuazione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n°69/2013**

**Sede Regionale Via Piave n°140 – Mestre Venezia
10 maggio 2013 ore 10.00**

*Segreteria Regionale per le Infrastrutture – Direzione Progetto Venezia
Soggetto responsabile attuazione dell’OCDPC n. 69/2013
Via Podgora 16 – 30171 Mestre Venezia Tel. 041/2795943 / 41 – Fax 041/2795944
e-mail: moranzani@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it>*

INDICE

Premesse	5
Finalità.....	5
Nuova perimetrazione Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera	6
Planimetria ripermetrazione SIN	7
Cronoprogramma.....	8
Attuazione degli Interventi e Criticità	9
Art.3 – Vasche di stoccaggio provvisorio su area 23 ha.....	9
Art.4 A - Impianti di trattamento preliminare	9
Art.4 C - Cassa di colmata in ampliamento del Molo Sali	9
Art.4 D - Discarica "Moranzani"	9
Art.6 – Interventi su linee elettriche.....	11
Art.7 – Interventi sulla viabilità.....	12
Art.8 - Interventi sulla rete idraulica del bacino del Lusore	13
Art.9 - Parchi urbani	15
Art.11 – Trasferimento San Marco Petroli.....	16
Art.12 – Interventi di fognatura	16
Accordo Integrativo del 04.02.2011 dell’A.d.P. “Moranzani”	18
Art.3 - Adeguamento funzionale di Via dell’Elettronica	18
Art.4 - Collegamento stradale tra Via dell’Elettricità e SR11	18
Art.5 - Terminal delle Autostrade del Mare.....	18
Attività finanziarie connesse al subentro della Regione Veneto alla Gestione Commissariale	19
Comunicazione e coinvolgimento della popolazione	20
Processo di Agenda 21	20
Comunicazione Web	20
Comunicazioni.....	21

Premesse

Come noto, l' OCDPC n. 69/2013 ha individuato la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia e a quelli connessi, previsti nell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 31 marzo 2008 e successive modificazioni.

Con la stessa Ordinanza il Direttore della Direzione Progetto Venezia della Regione Veneto, è stato individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è stato autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e a provvedere alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

A tal fine l'ordinanza ha altresì stabilito che, *"per l'espletamento di tali iniziative il predetto Direttore può altresì avvalersi della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato"*.

La DGRV n. 529 del 03.05.2013 ha tracciato la dimensione organizzativa necessaria all'assolvimento delle incombenze derivanti dall' OCDPC n. 69/2013, individuando Aree di Responsabilità all'interno dell'amministrazione regionale che fanno capo al Direttore della Direzione Progetto Venezia, nonché dando atto che con successivi provvedimenti lo stesso potrà procedere *"al coinvolgimento di soggetti appartenenti agli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma Moranzani nelle attività afferenti all'O.C.D.P.C. n. 69/2013, in modo da beneficiare del necessario coordinamento degli interventi in essere"*.

Finalità

Allo scopo di garantire un efficace assolvimento delle incombenze attribuite alla Regione Veneto, è necessario che gli enti interessati abbiano contezza circa l'avanzamento degli interventi nel periodo "transitorio" tra la formale cessazione della gestione commissariale ed il subentro della Regione Veneto. Nel presente documento si provvede ad operare un aggiornamento rispetto a quanto indicato nel Capitolo 5 della relazione redatta dal Commissario Delegato ex OPCM n. 3383 del 03.12.2004, già trasmessa ai soggetti sottoscrittori dell'Accordo Moranzani.

Sono state altresì evidenziate le principali criticità dei singoli interventi, in modo da consentire un quadro completo della situazione in atto.

In particolare, si è rilevata la necessità di un migliore coordinamento informativo tra le varie amministrazioni competenti, che la Regione Veneto intende rafforzare nell'ambito delle previsioni dell' OCDPC n. 69/2013. In tal senso, è **opportuno procedere all'individuazione di una figura referente per ogni amministrazione**, con il compito di informare costantemente il Direttore della Direzione Progetto Venezia riguardo all'avanzamento degli interventi e all'emergere di eventuali criticità.

Tanto, è richiesto anche dall'onere di relazionare con cadenza semestrale il Dipartimento di Protezione Civile sullo stato di attuazione degli interventi.

Nuova perimetrazione Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera

Da ultimo si segnala che, in data 24.04.2013 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha ridisegnato il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera.

Il perimetro del nuovo SIN è ridotto alla Zona Industriale di Porto Marghera, essendo escluse le aree con destinazione urbanistica Agricola e Residenziale/Commerciale, nonché i canali portuali e le aree lagunari.


Sulle aree escluse dal precedente SIN la competenza per l'approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica e messa in sicurezza è ricondotta in capo alla Regione.

La ripermimetrazione sarà efficace dalla data di pubblicazione del D.M. in Gazzetta Ufficiale.

Gli interventi esclusi dal SIN saranno i seguenti:

- Discarica
- Linee elettriche e cabine Terna (ad esclusione del tratto di linea a Ovest di San Marco Petroli, Sottostazione V, collegamento Sottostazione IV – Fusina 2, Sottostazione IV e Stazione Fusina 2)
- Linee elettriche ENEL e cabina primaria Fusina
- Interventi sulla rete idraulica del bacino del Lusore
- Interventi sulla viabilità (adeguamento Via dell'Elettronica, parte del Nodo Malcontenta, adeguamento Via dell'Elettricità, collegamento stradale fra Via dell'Elettricità e SR 11)
- Parchi Urbani (ad esclusione della porzione sull'area San Marco Petroli).

Planimetria ripериметrazione SIN

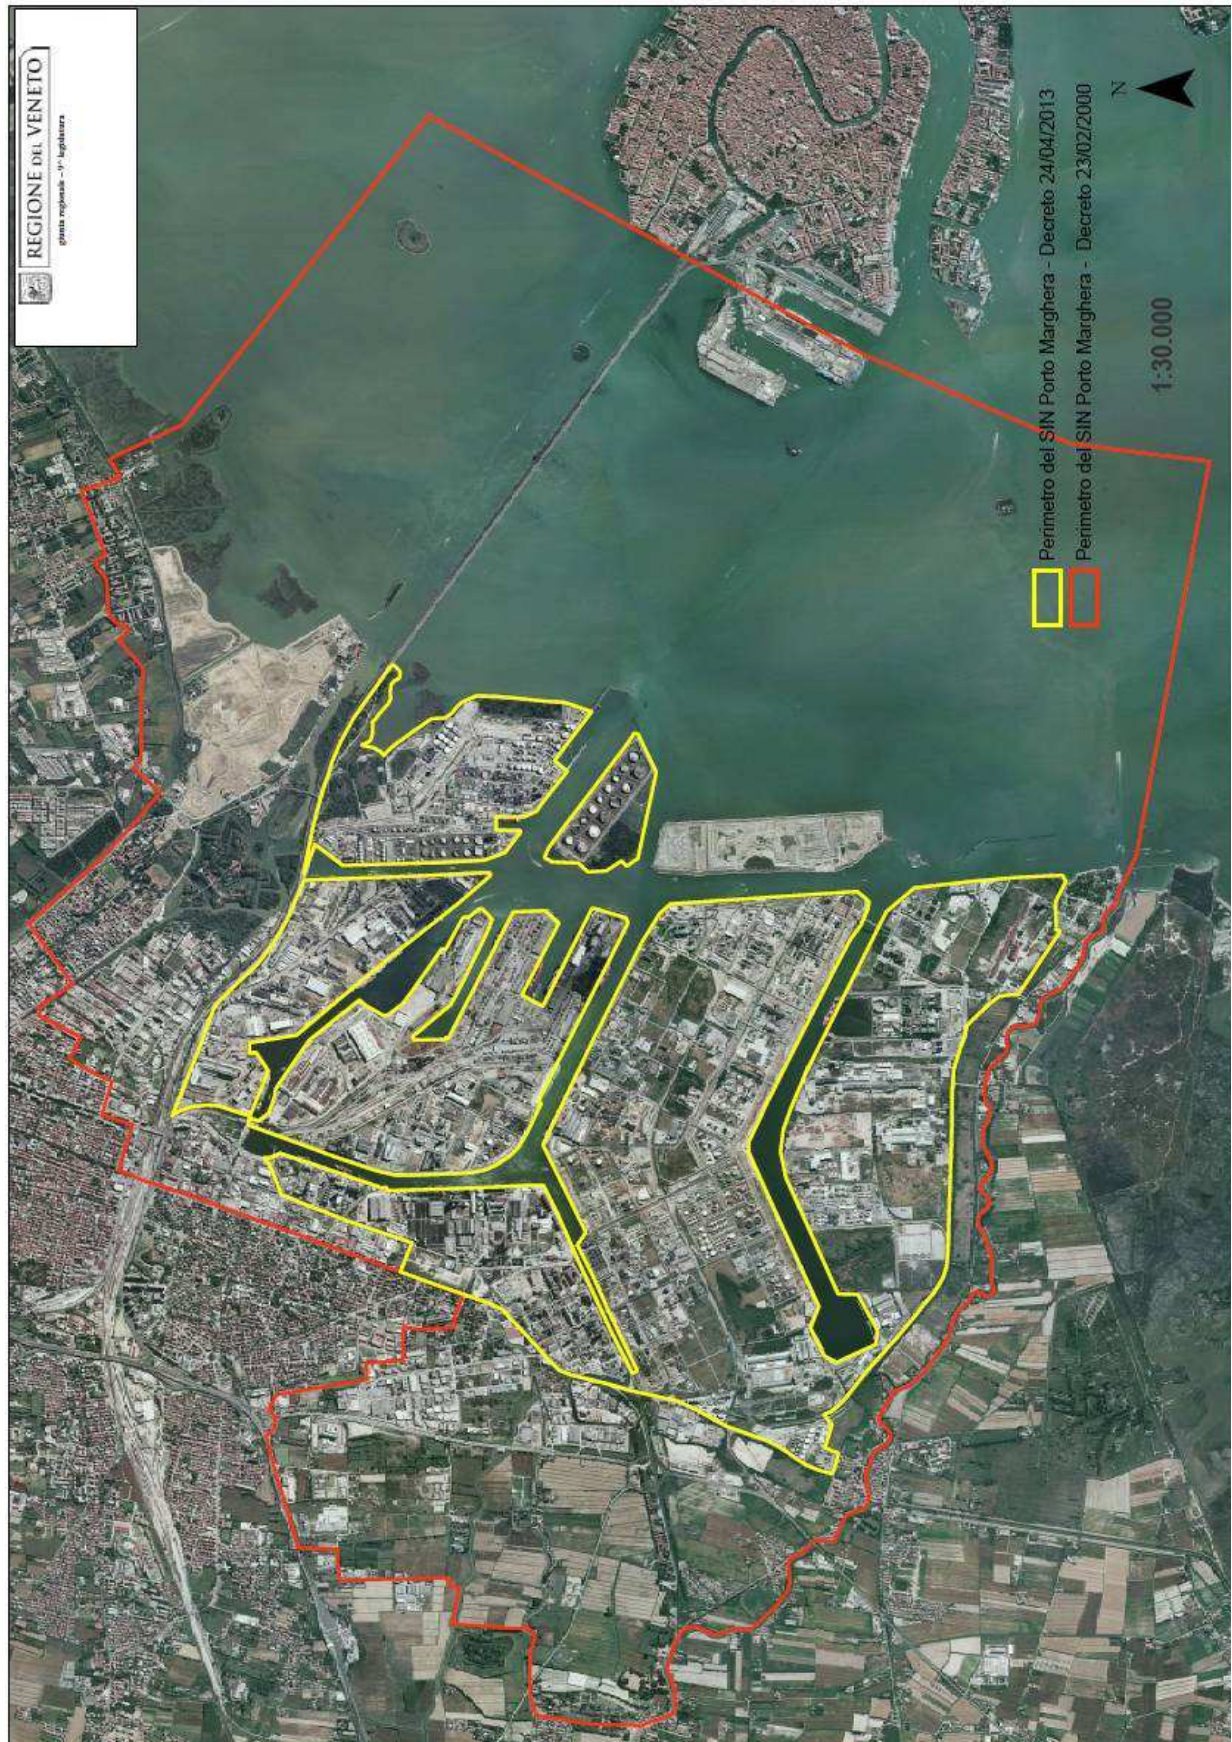

Cronoprogramma

ATTIVITA'	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE M.T. E B.T. (ENEL)																				
INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE A.T.																				
Stazioni Elettriche e completamento interramenti																				
Interramento linea 132 kV (Linea SUD Vallone Moranzani)																				
Interramento linee 380 - 220 kV (Linea NORD Vallone Moranzani)																				
DISCARICA VALLONE MORANZANI																				
Lotto 1/fase1 e lotto2/fase1																				
Lotto 1/fase2																				
Lotto 4																				
Lotto 3																				
Lotto 2/fase 2																				
CASSA DI COLMATA MOLO SALI																				
AREA 23 ha																				
Vasche di stoccaggio provvisorio																				
Infrastrutture e impianti																				
TRASFERIMENTO SAN MARCO PETROLI																				
PARCO LINEARE MALCONTENTA																				
VIABILITA'																				
Nodo malcontenta (autorita' portuale)																				
Svincolo su ss309 romea (provincia)																				
Prolungamento via dell'elettrica' (provincia-adeguamento srl1; APV proba)																				
TERMINAL RO-RO DI FUSINA																				
Area terminal ro-ro																				
Adeguamento via dell'elettronica																				
IDRAULICA																				
Opere a carico del Commissario emergenza idraulica																				
Opere a carico del Consorzio di bonifica Acque Risorgive																				
Opere a carico del Comune di Venezia																				

progettazione, attività preliminari
 esecuzione

Tabella Cronoprogramma al 31.12.2012

Attuazione degli Interventi e Criticità

(Rif.articoli A.d.P. "Moranzani")

Art.3 – Vasche di stoccaggio provvisorio su area 23 ha

Realizzazione Terza Vasca

Soggetto realizzatore	Magistrato alle Acque di Venezia
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">▪ Il progetto è stato approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 37 del 06.11.2012.▪ Il MAV in data 19.02.2013 ha comunicato che il Progetto Esecutivo ha avuto il parere favorevole del CTM in data 29.01.2013 e che "è in fase di emissione il D.P. di approvazione".▪ In data 11.02.2013 sono stati consegnati i lavori, che dovranno concludersi entro 130 gg. (20 Giugno 2013).

Rinnovo AIA Vasche Deposito Preliminare in area 23 ha – Vasca Sud

Soggetto gestore	SIFA S.c.p.a.
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">▪ Il 28.02.2013, con nota integrata in data 10.04.2013, SIFA S.c.p.a ha richiesto il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a suo tempo rilasciata dal Commissario Delegato ex OPCM 3383/2004 per la "Vasca Sud"▪ Il 22.04.2013 la richiesta è stata inviata all'U.C. Tutela Atmosfera per il rinnovo.

Art.4 A - Impianti di trattamento preliminare

Vasche accettazione/caratterizzazione e trattamenti fisici

Soggetto realizzatore	SIFA S.c.p.a.
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">▪ Il progetto è stato approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 34 del 16.10.2012▪ In data 16.01.2013 i lavori di allestimento sono stati avviati. SIFA deve indicare i tempi di esecuzione dell'intervento.

Impianto di trattamento chimico di rifiuti contaminati da inorganici (Hegemann)

Soggetto realizzatore	SIFA S.c.p.a.
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">▪ Con Decreto del Commissario Delegato n. 47 del 19.12.2012 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione e gestione dell'impianto.

Criticità	<ul style="list-style-type: none">▪ In data 16.03.2013 i lavori di allestimento sono stati avviati e devono concludersi entro il 16.03.2014.▪ E' necessario che il Concessionario Regionale inoltri alla Commissione VIA Regionale la richiesta di modifica relativamente ad alcune prescrizioni che aumentano significativamente i costi del progetto, non previsti dal quadro economico dell'AdP 31.03.2008.
------------------	---

Impianti trattamento HPSS, Novosol e Limocon

Soggetto realizzatore	SIFA S.c.p.a.
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">▪ SIFA deve presentare alla Commissione VIA i progetti definitivi.

Art.4 C - Cassa di colmata in ampliamento del Molo Sali

Soggetto competente	SIFA S.c.p.a.
Criticità	<ul style="list-style-type: none">▪ Nel corso delle attività di refluentamento si sono verificati degli assestamenti del palancolato perimetrale che hanno comportato una modifica alle modalità di gestione ed una conseguente riduzione della volumetria conferibile.▪ Il concessionario regionale deve predisporre un progetto per la risoluzione della criticità.

Art.4 D - Discarica "Moranzani"

Soggetto realizzatore	SIFA S.c.p.a.
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">▪ Con Decreto del Commissario Delegato n. 34 del 16.10.2012 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione della discarica.▪ I lavori di allestimento sono stati avviati in data 16.01.2013 e si concluderanno nel rispetto del cronoprogramma di progetto.▪ E' in fase di redazione l'apposita Convenzione per il trasferimento a SIFA S.c.p.a. del contributo di 13 Milioni di € già impegnati dal Commissario Delegato per la realizzazione di un primo stralcio urgente.▪ Con nota n. 296281 del 26.06.2012 la Regione ha chiesto a Sifa di predisporre la documentazione necessaria per avviare la procedura di richiesta di "sottocategoria", allo scopo di consentire il ricevimento dei rifiuti derivanti da bonifiche in area SIN.
Criticità	<ul style="list-style-type: none">▪ E' urgente la realizzazione della discarica, anche per il risezionamento del fosso "Fondi a Est".▪ E' urgente che Sifa inoltri la richiesta di integrazione dei codici CER conferibili nelle vasche di accettazione e in discarica e predisponga la documentazione necessaria per inoltrare la richiesta di "sottocategoria" per la discarica.

- Entrambe le richieste devono essere sottoposte alla Commissione VIA.

D.1 - Messa in sicurezza permanente area "Moranzani B"

Soggetto realizzatore	SIFA S.c.p.a.
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">▪ Il progetto è stato approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 30 del 29.08.2012.▪ Non sono previsti nel cornoprogramma tempi per l'avvio e la conclusione dei lavori.
Criticità	<ul style="list-style-type: none">▪ SIFA S.c.p.a. deve attivarsi per eseguire urgentemente l'intervento, in quanto è stato comunicato al MATTM che i lavori saranno completati entro il 2015.

Art.6 – Interventi su linee elettriche

Artt.6.1 / 6.2 – Linee ed impianti TERNA

Soggetti competenti	TERNA S.p.A. e SIFA S.c.p.a.
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">▪ 08.04.2013 sottoscritto Piano di gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di TERNA di cui agli art. 6.1 e 6.2 dell'AdP.▪ 04.04.2013 trasmesso progetto esecutivo Stazione Elettrica "Romea"▪ 18.04.2013 trasmesso progetto esecutivo Stazione Elettrica "Malcontenta".▪ 10.05.2013 in corso bonifica ordigni bellici nell'area della Stazione Elettrica Fusina 2▪ 06.05.2013 avvio da parte di TERNA delle attività sulle linee elettriche in Comune di Venezia.
Criticità	<ul style="list-style-type: none">▪ Devono essere completate le acquisizioni delle aree necessarie per la realizzazione delle Stazioni Elettriche di Romea e di Malcontenta.▪ Il 30.04.2013 si è tenuta l'udienza di merito del TAR Lazio sui ricorsi presentati relativamente al progetto dell'elettrodotto TERNA. La sentenza dovrebbe essere depositata nell'arco di 2 mesi.▪ Al fine di risolvere le criticità evidenziate da TERNA e connesse ad interferenze con altri interventi dell'AdP, verranno calendarizzati una serie di incontri con i soggetti competenti, per pianificare le attività conseguenti.▪ Eliminazione dell'interferenza SNAM con la Stazione Elettrica Malcontenta: è stato presentato il progetto per la nuova condotta SNAM la cui approvazione è di competenza del Comune di Venezia, che dovrà rilasciare il relativo Permesso di Costruire. Si sta operando un'attività di coordinamento per lo svolgimento della CdS.

Art.6.3 - Interventi per le linee elettriche B.T. e M.T – ENEL

Soggetti competenti	ENEL S.p.A. e SIFA S.c.p.a.
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">26.04.2013 ENEL comunica che in data 13.05.2013 avranno inizio i lavori di realizzazione della Cabina Primaria Fusina 2.

Art.7 – Interventi sulla viabilità

Nodo Malcontenta

Soggetto competente	Autorità Portuale di Venezia
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">19.03.2013 Conferenza di servizi decisoria indetta da APV per l'approvazione del progetto definitivo.15.04.2013 consegna dei lavori all'impresa appaltatrice.
Criticità	<ul style="list-style-type: none">26.04.2013 il TAR veneto ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento di aggiudicazione.

Prolungamento via dell'Elettricità (raddoppio SR 11)

Soggetto competente	Provincia di Venezia
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">In data 21.12.2012 è stato sottoscritto Pre-accordo integrativo, da Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Autorità Portuale di Venezia, Veneto Strade Spa, Comitato Utenti di Agenda 21, Comitato Utenti via della tecnica in seguito al quale deve essere sviluppata una soluzione provvisoria iniziale, (rotonda su SR11) che costituirà variante al progetto approvato mediante la sottoscrizione di uno specifico ADP integrativo, <u>da perfezionare entro giugno 2013</u>.
Criticità	<ul style="list-style-type: none">Non è stato predisposto il progetto preliminare della soluzione in variante ed il relativo AdP integrativo.

Svincoli a livelli sfalsati sulla SS 309 Romea

Soggetto competente	Provincia di Venezia
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">In data 21.12.2012 è stato sottoscritto Pre-accordo integrativo, da Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Autorità Portuale di Venezia, Veneto Strade Spa, Comitato Utenti di Agenda 21, Comitato Utenti via della tecnica, in seguito al quale deve essere sviluppata una soluzione alternativa (svincolo a diamante con Romea a scavalco) che costituirà variante al progetto

Criticità	<p>approvato mediante la sottoscrizione di uno specifico ADP integrativo, <u>da perfezionare entro giugno 2013</u>.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Non è stato predisposto il progetto preliminare della soluzione in variante ed il relativo AdP integrativo.
------------------	---

Art.8 - Interventi sulla rete idraulica del bacino del Lusore

Interventi a cura del Commissario Emergenza Idraulica ex OPCM 3621/2007

Soggetto competente	Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
----------------------------	--

Intervento A.1.1-1° lotto .- Riduzione ostruzioni Fossa di Chirignago a nord dell'autostrada A4.:

Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">▪ Lavori collaudati
------------------------------------	---

Intervento A.1.1 - 2° lotto - Ricalibratura fossa di Chirignago a sud dell'autostrada A4:

Criticità	<ul style="list-style-type: none">▪ I lavori dovevano essere iniziati entro sei mesi dall'ordinanza di trasferimento dei fondi n. 20 del 1.10.2012 e pertanto entro il 01.04.2013.
------------------	--

Intervento A.2 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – 1° lotto – Nuovo sifone sotto il Canale di Oriago:

Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">▪ Lavori collaudati
------------------------------------	---

Intervento A.2- Interventi rete idraulica bacino Lusore – 2° lotto – Ricalibratura corso d'acqua Fondi a Sud:

Criticità	<ul style="list-style-type: none">▪ I lavori dovevano essere iniziati entro sei mesi dall'ordinanza di trasferimento dei fondi n. 14 del 30.07.2012 e pertanto entro il 30.01.2013.
------------------	---

Intervento B.4 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Potenziamento dell'idrovora di Ca' Emiliani:

Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">▪ Lavori collaudati
------------------------------------	---

Interventi a carico del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Soggetti competenti	<p>Per la progettazione: SIFA S.c.p.a. Per la realizzazione: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive</p>
----------------------------	--

Intervento A.1.2 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Ricalibratura Fosso 2, Fosso 6, Fosso 7, Diversivo Fosso 7 e Fosso Colombara.

Intervento A.3 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – 2° lotto – Rimodellazione per invaso e sistemazione a

parco del bacino Cesenego-Vecchio Comuna (Parco Lusore) e collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo tramite il circuito del Forte Tron.

Intervento A.4 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, ricalibratura Fondi a Est, fosso di via Moranzani e nuovo collegamento con Fondi a Sud.*

Intervento A.5 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore – Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino di Malcontenta.*

Intervento A.6 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore – Sistemazione a parco del Parco Lusore e del Parco Malcontenta.*

Intervento B.1 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore – Nuova inalveazione del Lusore – Menegon.*

Intervento B.2 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore – Adeguamento Idrovora Malcontenta con deviazione canale di scarico e manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche*

Stato di avanzamento lavori

- Il progetto definitivo complessivo suddiviso in stralci è stato approvato ad agosto 2012, con una previsione economica complessiva maggiore rispetto a quanto inserito nell'AdP Moranzani.
- È in corso di redazione una convenzione tra Regione Veneto e Consorzio di Bonifica per regolamentare: attività espropriative, attività di validazione dei progetti/approvazione, modalità di erogazione dei fondi derivanti dai proventi della tariffa, necessari per la realizzazione delle opere.

Criticità

- Il Concessionario Regionale non ha ancora consegnato il progetto esecutivo del primo stralcio, la cui approvazione era prevista entro dicembre 2012.
- Ad oggi, tenuto conto dell'avanzamento degli interventi sulla Viabilità ed il relativo pre-accordo integrativo e degli interventi sulle Linee Elettriche di competenza ENEL e TERNA, risulta necessario aggiornare il piano delle priorità che dovranno essere coerenti con le risorse economiche disponibili. Gli interventi da avviare urgentemente sono:
 - A.4.1 - NUOVO COLLEGAMENTO FONDI A EST FONDI A SUD
 - A.5 - A.6 - PARCO MALCONTENTA - AREE ALLAGAMENTO CONTROLLATO E SISTEMAZIONE A PARCO
 - A.4.2 - REALIZZAZIONE FOSSO DI VIA MORANZANI

Interventi a carico del Comune di Venezia

Soggetti competenti

Per la progettazione: Concessionario Regionale
Per la realizzazione: Comune di Venezia

Intervento B.3 - *Interventi rete idraulica bacino Lusore – Realizzazione di una vasca di prima pioggia nell'ex alveo del Lusore*

Intervento B.5 - *Realizzazione di nuova fognatura in Via Colombara*

Stato di avanzamento lavori

- Il cronoprogramma prevede l'avvio delle attività di progettazione a partire dal gennaio 2015.
- È in fase di definizione la modalità di approvazione dei progetti esecutivi degli stralci, con dichiarazione di pubblica utilità. In particolare si potrà valutare l'opportunità di far approvare al Comune di Venezia i progetti esecutivi e le procedure di esproprio connesse.

Art.9 - Parchi urbani

Parco urbano nell'area Malcontenta C

Soggetto competente

Comune di Venezia

Criticità

- L'acquisizione delle aree, di competenza del Comune di Venezia, riveste carattere d'urgenza in quanto consente la realizzazione delle opere previste da interventi dell'idraulica (primo stralcio), delle linee elettriche, la realizzazione della pista ciclabile prevista nell'intervento Viabilità Nodo Malcontenta, nonché la realizzazione delle opere connesse alla MISP approvata.

Bosco di Marghera – Parco del Brombeo

Soggetto competente

Provincia di Venezia

Criticità

- Il progetto non è stato presentato. È necessario acquisire conferma da parte della Provincia di Venezia circa l'impegno ad eseguire quanto previsto dall'AdP.

Parco lineare Moranzani

Soggetto competente

SIFA S.c.p.a.

Stato di avanzamento lavori

- Con decreto del Commissario Delegato n. 44 del 18.12.2012 è stato approvato il progetto di Messa in sicurezza permanente dell'area. Non risulta che i lavori siano stati avviati.
- Con nota del 24.04.2013 Terna ha comunicato il cronoprogramma delle proprie attività che rendono necessaria la realizzazione della MISP approvata relativa all'Area Tralicci di San Marco Petroli.

Criticità

- Deve essere attuato l'intervento di bonifica dell'area tralicci, il cui onere è previsto nell'art. 11 e risulta parzialmente coperto dal trasferimento dal Ministero dell'Ambiente delle somme provenienti dalla transazione di SMP. L'intervento è propedeutico alle opere di interrimento degli elettrodotti. È in fase di inoltrare formale richiesta di trasferimento delle somme dal Ministero dell'Ambiente alla Contabilità Speciale.

Art.11 – Trasferimento San Marco Petroli

Soggetto competente	Regione del Veneto per tramite di SIFA S.c.p.a.
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">La Regione ha richiesto al proprio concessionario di procedere con le attività necessarie alla redazione del progetto preliminare, ivi compresi gli eventuali aggiornamenti richiesti dai mutamenti legislativi intercorsi, specie in materia di sicurezza.
Criticità	<ul style="list-style-type: none">Da alcune valutazioni preliminari risultano maggiori oneri connessi alle nuove disposizioni legislative che comportano un incremento della somma originariamente prevista.

Art.12 – Interventi di fognatura

Soggetto competente	Comune di Venezia
<i>p.to 1 Completamento della rete di fognatura separata nell'area di Malcontenta</i>	
Criticità	<ul style="list-style-type: none">Non ancora pervenuta progettazione da parte del Comune di Venezia
<i>p.to 2 Completamento rete fognaria e relativi allacciamenti area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta (ora potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini Fusina e Campalto)</i>	
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">Lavori ultimati relativi allo stralcio finanziato
<i>p.to 3 Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3.</i>	
Criticità	<ul style="list-style-type: none">Non ancora definiti i contenuti finali dell'Accordo di Programma denominato "1^ zona industriale" per la gestione delle acque di dilavamento in un'area di Porto Marghera.
<i>p.to 4 Opere di disinquinamento ambito Fusina: diminuzione acque parassite</i>	
Soggetto attuatore	Veritas
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">24.09.2012 proroga ultimazione delle attività al 31.12.2014.
<i>p.to 5 Progetto relativo ad attività di eliminazione delle acque parassite nel bacino di Fusina</i>	
Soggetto attuatore	Veritas
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">Intervento collaudato
<i>p.to 6 Ristrutturazione della rete fognaria della zona del centro di Marghera (VE)</i>	
Stato di avanzamento lavori	<ul style="list-style-type: none">Intervento collaudato
<i>p.to 7 Ristrutturazione rete fognaria secondaria zona Nord e Centro Marghera (ora potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma: bacini di Fusina e Campalto)</i>	

Stato di avanzamento lavori

- Lavori ultimati relativi allo stralcio finanziato

p.to 8 *Fognature afferenti all'impianto di Fusina*

Criticità

- Non ancora pervenuta progettazione da parte del Comune di Venezia

Accordo Integrativo del 04.02.2011 dell'A.d.P. "Moranzani"

Art.3 - Adeguamento funzionale di Via dell'Elettronica

Soggetto competente | Autorità Portuale di Venezia

Primo stralcio: potenziamento del collegamento stradale e ferroviario

Stato di avanzamento lavori |
▪ 16.04.2013 approvazione di una perizia di variante con previsione di ultimazione dei lavori a luglio 2013

Secondo stralcio: Prima Fase - Realizzazione di tre rotonde

Stato di avanzamento lavori |
▪ In fase di redazione progetto esecutivo

Secondo stralcio: Prima Fase – Ampliamento del sedime stradale

Art.4 - Collegamento stradale tra Via dell'Elettricità e SR11

Soggetto competente | Autorità Portuale di Venezia

Art.5 - Terminal delle Autostrade del Mare

Bonifica aree

Piattaforma logistica Fusina

Soggetto competente | Autorità Portuale di Venezia

Stato di avanzamento lavori |
▪ Perfezionamento della Variante Urbanistica a seguito di accordo di programma ex art. 32 LR35/2001: attività in corso da parte della Regione Veneto.

Criticità |
▪ La Commissione Salvaguardia di Venezia, nella seduta n. 4/13 del 24.04.2013 ha espresso un parere favorevole, con prescrizioni, che in particolare contrastano con le soluzioni viabilistiche già approvate dal Commissario Delegato ed in fase di realizzazione.

Attività finanziarie connesse al subentro della Regione Veneto alla Gestione Commissariale

10/4/2013 Comunicazione alla Banca d'Italia del subentro nella contabilità speciale n. 3256 e deposito firma dott. G. Artico. (Nota prot. n. 15710 del 10/4/2013).

18/4/2013 Comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del subentro nella titolarità della contabilità speciale n. 3256. (Nota prot. n. 167704 del 18/4/2013).

29/4/2013 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 69/2013.

2/5/2013 Richiesta Durc per procedere ai pagamenti in scadenza già programmati dalla Gestione commissariale.

8/5/2013 Autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (con nota prot. n. 36309 del 23/04/2013) di variazione dell'intestazione della contabilità speciale n. 3256 con nuova denominazione "D.D.R. Prog. Ven. O. 3383-04 69-13"

Comunicazione e coinvolgimento della popolazione

Processo di Agenda 21

Come previsto al comma 12 dell'art. 1 dell'OPCDC 69/2012, è necessario continuare, attraverso il processo di Agenda 21, le attività e le iniziative finalizzate all'informazione ed alla più ampia partecipazione ed al coinvolgimento della cittadinanza interessata agli interventi dell'Accordo di Programma "Moranzani" e relativi Atti Integrativi.

- A tal fine, in continuità con le azioni previste dal contratto stipulato nel 2012, in data 26 aprile 2013, si è richiesta alla Ditta Aequa Engineering la disponibilità all'espletamento del servizio per l'anno 2013, tra l'altro, per l'organizzazione degli incontri con la cittadinanza di Malcontenta comprensiva della facilitazione e verbalizzazione delle serate e produzione del materiale necessario allo svolgimento delle attività previste negli incontri, di alcune visite con il Comitato Utenti presso i luoghi dei lavori e di un evento "plenario" verso la fine del 2013, aperto a tutta la popolazione.
- Acquisita in data 2.05.2013 la nota della Ditta Aequa Engineering di disponibilità a svolgere la attività previste, si è in fase di predisposizione dei relativi atti.

Comunicazione Web

Il sito www.ccpv.it relativo all'attività del Commissario delegato è ancora attivo, per fornire il necessario supporto informativo sulle attività dell'Accordo di Programma "Moranzani" e relativi Atti Integrativi, ad uso interno e pubblico.

- In data 26 aprile 2013 si è richiesto alla Ditta EDEM Sas la disponibilità al mantenimento del servizio di hosting del sito web non oltre la fine 2013, per permettere alla Regione del Veneto la migrazione dei contenuti e l'integrazione con nuove funzionalità su apposito spazio web regionale, predisposto dalle competenti strutture.
- Acquisita in data 2.05.2013 la nota della Ditta EDEM Sas di disponibilità a svolgere la attività previste, si è in fase di predisposizione dei relativi atti.

Comunicazioni

Questi i contatti a cui far pervenire tutte le comunicazioni:

Segreteria Regionale per le Infrastrutture – Direzione Progetto Venezia
Soggetto responsabile attuazione dell'OCDPC n. 69/2013
Via Podgora 16 – 30171 Mestre Venezia
Tel. 041/2795943 / 41 – Fax 041/2795944
e-mail: moranzani@regione.veneto.it
<http://www.regione.veneto.it>
PEC : protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
